



Landkreis  
Rotenburg  
(Wümme)



# Sachstandsbericht

Schulneubau Bremervörde

[www.lk-row.de](http://www.lk-row.de)



# Grundsteinlegung





# Anlieferung Fertigbetonelemente





# Aufstellen Fertigbetonelemente





# Aufstellen Wandelemente





# Betonfertigteil Montage





# Abklebung Sohle





# Abklebung Dachgeschoss





# Sockelabdichtung





# Brandschutzverkleidung Stützen





# Aussenwandelemente





# Aussenwandelemente






# Aktueller Baustand



# Terminplan 2021

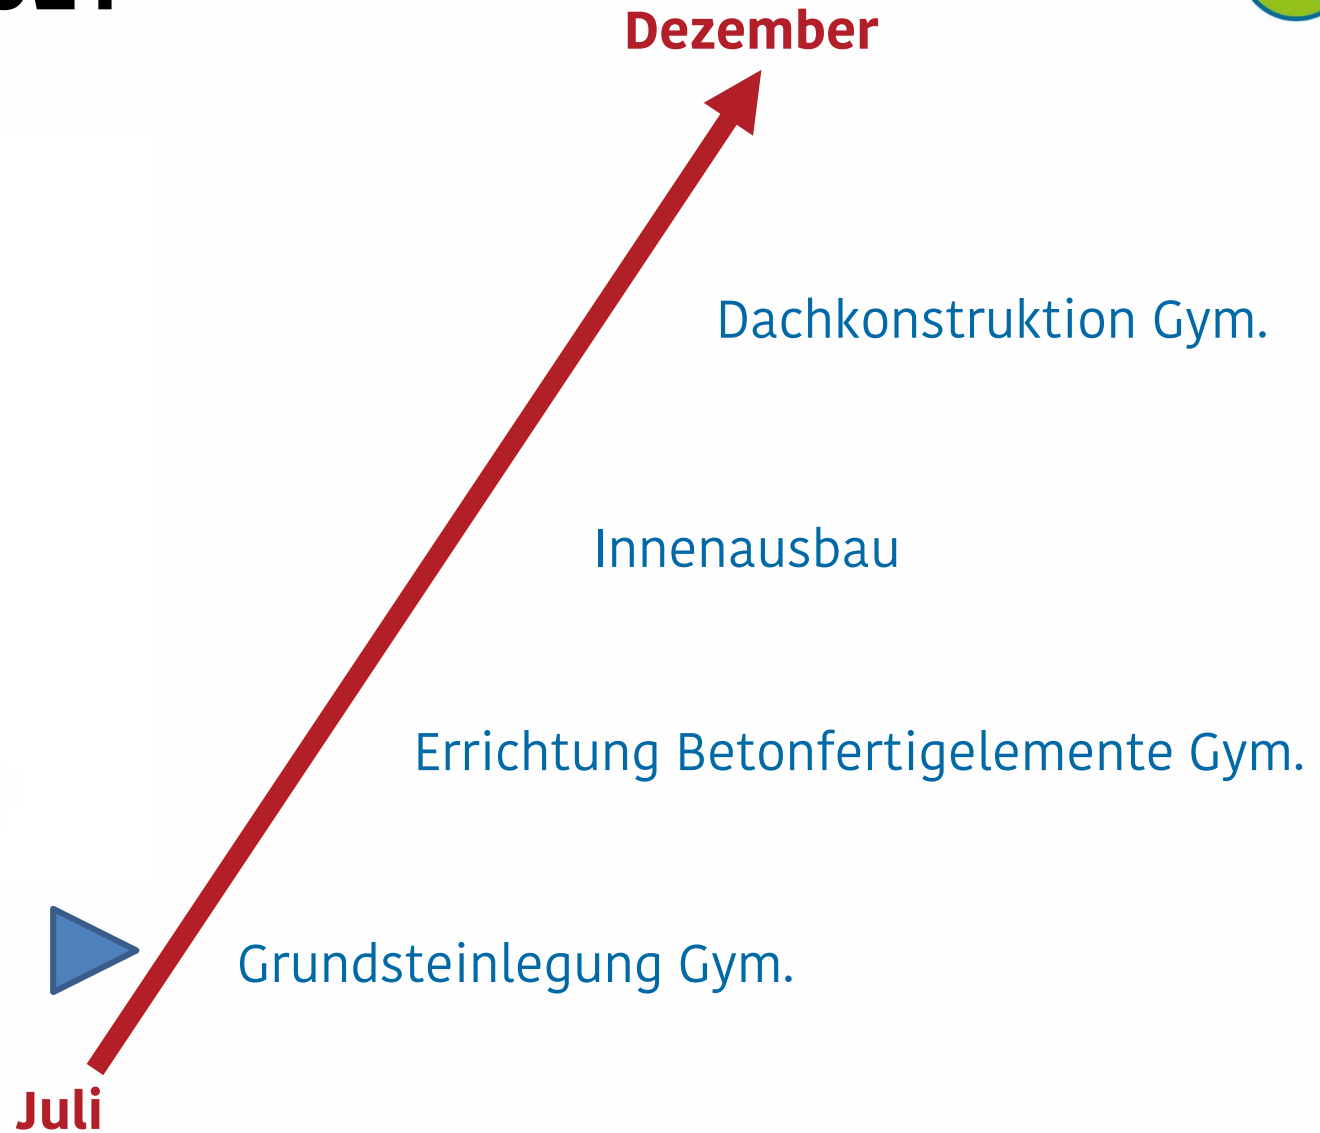





# Laufende Gewerke

- Betonfertigteil-Montage
- Abklebung Dachgeschoss und Sohle
- Sockelabdichtung
- Blitzschutz
- Brandschutzverkleidung Stützen







# Laufende Planung

- Fachraumplanung Gymnasium: Freigabe durch den Landkreis erfolgt
- Möblierungsplanung in Abstimmung
- Ausführungsplanung T-Deck in Abstimmung







## Start neuer Gewerke

39KW: Maurer (Fassade)

39kW: Elektro (Kabeltrassen, etc)

39kW: Lüftung Heizung

40kW: Zimmermann (Dachstuhl)





# Arbeitsgruppe „Umzug Gymnasium“



Ab Oktober konstituiert sich die Arbeitsgruppe „Umzug Gymnasium“.

Mitglieder:

- Gymnasium
- Landkreis
- Goldbeck





# Termin



Ab Mitte Oktober befindet sich das Projekt wieder im Terminplan. Vorausgegangen war die ungeplante Sondergründung im Mai/Juni. Diese hatte 3 Wochen in Anspruch genommen.





# Ansprechpartner/in



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Hopfengarten 2  
27356 Rotenburg (Wümme)

Andreas von Fintel  
Tel. 04261 983-2218  
[andreas.von-fintel@lk-row.de](mailto:andreas.von-fintel@lk-row.de)
